

Relazione relativa al 2° S.A.L.

AGGIORNAMENTO PROGETTO – OTTOBRE 2023

Nel mese di luglio, il progetto è stato di fatto ultimato nelle sue parti essenziali, sono stati montati gli arredi, i pannelli illustrativi, sono iniziati i cicli di irrigazione degli alberi. Il giorno 18 luglio è stata organizzata una prima iniziativa di inaugurazione dell'area risistemata a cui a preso parte l'Assessora all'Ambiente del Municipio, rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, diverse associazioni e cittadini della rete territoriale. Come già preannunciato (vedi Relazione primo SAL), la conclusione del progetto slitterà a fine novembre per permettere di chiudere il primo ciclo di irrigazione delle piante messe a dimora che per via della pressante siccità proseguirà per tutto il mese di ottobre.

Entro il mese di ottobre potrà anche essere effettuato

lo studio previsto sullo stato puntuale delle piante a fine estate per capire quelle che necessitano dei trattamenti e quelle che devono essere eventualmente sostituite, attività che saranno poi realizzate nel mese di novembre.

Saranno inoltre completate alcune opere previste, così da utilizzare i fondi restanti attraverso una piccola variazione del budget iniziale per implementare alcune attività che si ritengono fondamentali. Per tale scostamento – ampiamente entro il 10% del budget totale- ma superiore al 15% per delle singole voci, è stata presentata una domanda di variazione. L'importo ottenuto da alcune economie, verrà utilizzato per ampliare gli arredi, i cartelloni informativi, e per realizzare una serie di iniziative per favorire la partecipazione e la conoscenza dei cittadini di questa area, fondamentale per la sua conservazione.

otto per mille
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Da discarica a bosco urbano
"progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai"

da DISCARICA a BOSCO URBANO
Parco Regionale Urbano di Aguzzano - Roma

martedì 18 luglio 2023
ore 18,30

Inaugurazione del progetto
"DA DISCARICA A BOSCO URBANO"

appuntamento all'ingresso del
Parco Regionale Urbano di Aguzzano
in via Casale San Basilio

CASALE
PODERE
ROSA
Casale Podere Rosa - APS
con il patrocinio gratuito di:
Ente Regionale RomaNatura
Roma Capitale - Municipio Roma IV
con il supporto di:
Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale

RomaNatura
Ente Regionale
del Lazio
per la tutela
dell'ambiente
e il sostegno di:
ACRE - Centro di Aguzzano, Coop. Soc. l'Arco
d'Orò, Comitato di Quartiere Rebbibbia, Rete per Aguzzano

ROMA
Municipio IV

ROMA
CAPITALE


Al momento sono in fase di ultimazione alcuni interventi previsti come il posizionamento dei cartelli di indicazione delle essenze presenti, la sistemazione finale del percorso con le indicazioni previste, alcune opere nel verde.

Rispetto allo stato del bosco una prima analisi ci mostra segnali incoraggianti: generalmente è previsto il mancato attecchimento del 10% delle piante messe a dimora, e dunque nel nostro caso le essenze da reintegrare sarebbero dovute essere n.20, in realtà sembrerebbe che meno del 5% degli alberi messi a dimora non sono riuscite a attecchire. Questo è un segnale incoraggiante per lo sviluppo del bosco nell'area di progetto. Le piante aggiuntive che verranno messe a dimora, per compensare queste poche essenze che mostrano segni di sofferenza, saranno di maggiori dimensioni, rispetto a quanto preventivato inizialmente, per aumentare la diversità di età degli alberi nel nuovo bosco, come avviene negli ambienti che si sono formati in modo del tutto naturale.

STATO DEGLI ALBERI


Una prima verifica conclusa nel mese di settembre ci rappresenta il seguente stato della vegetazione, lo studio sarà concluso alla fine del mese di ottobre così da avere un quadro completo e poter agire di conseguenza.

Le condizioni climatiche particolarmente avverse che si sono verificate nel corso dell'estate 2023, con persistenti elevate temperature sia diurne che notturne, hanno comportato l'incremento degli interventi di irrigazione, effettuati - nei mesi di luglio, agosto e settembre - con frequenza settimanale e una costante attività di monitoraggio dello stato di salute delle piante messe a dimora. Ciò ha permesso di aggiornare la mappa della situazione reale del bosco urbano, che attualmente è la seguente (fig. 1):

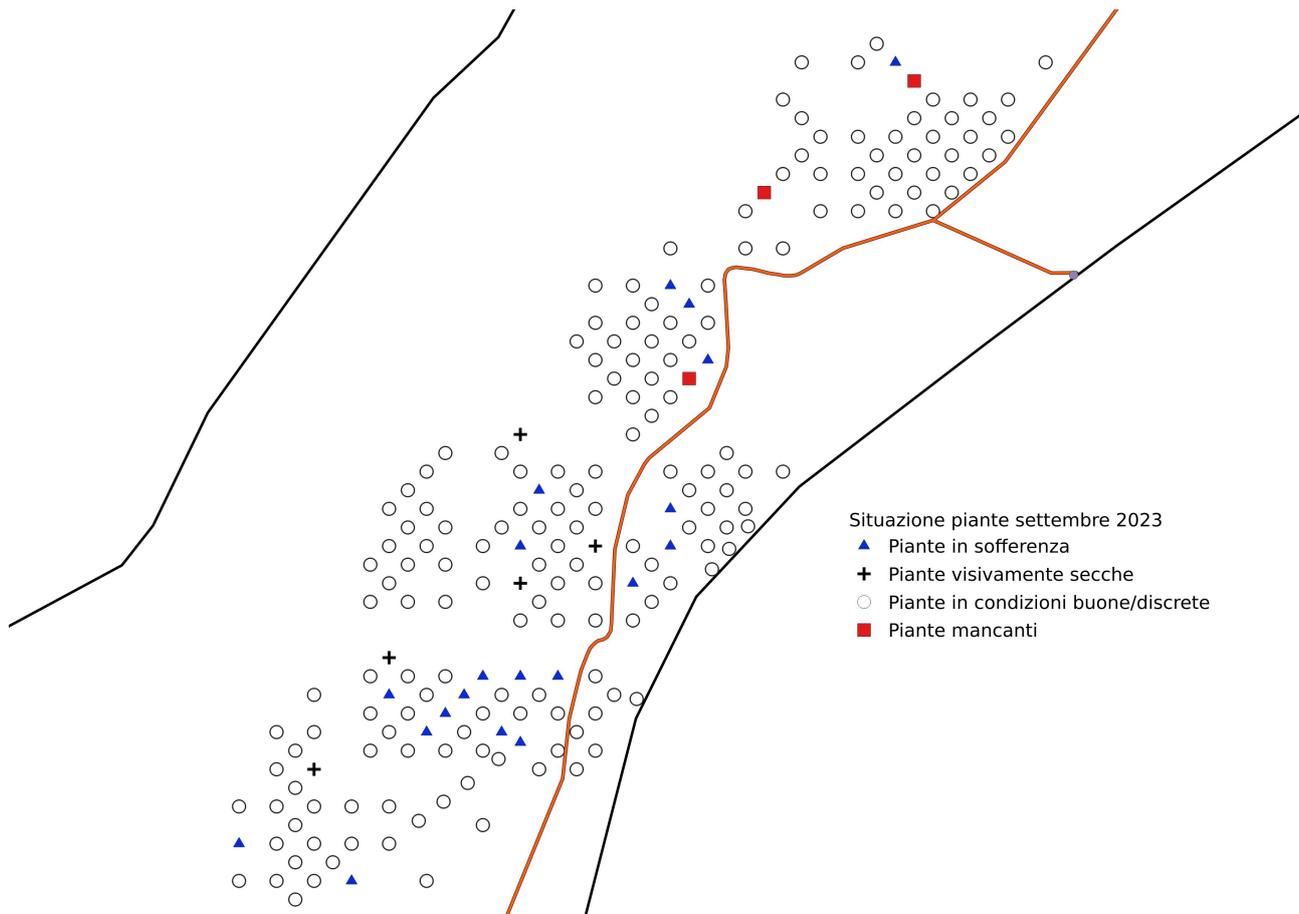

- n. 20 piante presentano segni di stress, mostrando tuttavia una sostanziale vitalità. Si tratta di piante che avranno una ripresa vegetativa nella prossima primavera, anche se indebolite e più esposte ad attacchi parassitari. Necessitano di cure colturali e costante monitoraggio;
- n. 5 piante sembrano visivamente secche e verranno sostituite, aggiungendo altrettanti alberi senza però al momento eliminarle, aspettando in ogni caso la primavera per la verifica finale;
- n. 3 piante sono mancanti per effetto di incidenti vari (calpestio, sfalcio, ecc) e verranno sostituite;
- n. 174 piante hanno superato positivamente la stagione estiva e si trovano attualmente in stato da discreto a eccellente. (Ricordiamo che le piante sono complessivamente 202).

Nel bosco sono in corso di allestimento: n. 25 cartelli descrittivi delle piante (fig. 2) montati su supporti metallici (fig. 3), che verranno posizionati alla base delle piante più rappresentative e che forniranno al frequentatori elementari informazioni sulle caratteristiche delle specie messe a dimora .



ARREDI

Gli arredi installati nell'ambito del progetto consistono in n. 2 tavoli picnic, n. 6 panchine in legno, n. 2 cartelli didattici e n. 1 bacheca in legno bifacciale. La manutenzione degli arredi consiste nel periodico trattamento con prodotti impregnanti e protettivi al fine di assicurare il loro mantenimento. Inoltre è previsto il riposizionamento di una panchina divelta da ignoti ma lasciata integra, che verrà collocata in luogo più idoneo all'interno dell'area di progetto.



PERCORSO

E' previsto un ulteriore intervento manutentivo del percorso nel prossimo mese, nello stesso periodo verranno inoltre posizionati n. 13 cartelli indicatori, a forma di freccia, per caratterizzare il sentiero realizzato nel corso del progetto e facilitare i frequentatori nell'orientamento all'interno del parco.

MANUTENZIONE DEL SITO

Concluso il progetto la manutenzione sarà di competenza dell'amministrazione, ma per evitare che questo importante lavoro perda di qualità l'associazione proseguirà in ogni caso le attività di manutenzione con periodici interventi di sfalcio dell'erba, così come gli interventi di irrigazione anche nel 2024. Inoltre saranno effettuati interventi di taglio selettivo per mantenere la percorribilità del sentiero realizzato nel corso del progetto e per consentire l'accesso ai tavoli picnic e alle panchine installate.

RELAZIONE ECONOMICA

Nel presente sal sono comprese gran parte delle opere conclusive del progetto ad eccezioni di alcune per le quali non sono ancora arrivate tutte le fatture o che non sono state ancora ultimate. Come riportato nella premessa, sono previste alcune variazioni rispetto al budget iniziale per le quali è stata presentata una apposita relazione, pertanto in questo sal sono contabilizzate solo spese già previste inizialmente

Roma 24/10/2023

il Presidente

Giampaolo Galli

